
寻求高效节能之路

——北京联通仓储式模块化数据中心





- 1 北京联通仓储式模块化数据中心
 - 2 北京联通绿色节能措施
 - 3 北京联通未来数据中心发展方向

北京联通数据中心业务概述



--创新·改变世》

■ 机房:截至2014年9月,已建成数据中心近40个,机房面积超过8万平方米; 机房建设标准均参照国际TIER Ⅲ+、TIER Ⅲ标准。

■ 机架:截至2014年9月,北京联通可投产机架数超过2万架,单机架供电能力可达 2.2KW~14KW,后期可根据用户需求进行定制化改造。

■ <mark>带宽</mark>:截至2014年9月,北京联通IDC总出口带宽近2T,年底扩容后总带宽将 达到3T.














北京联通数据中心评优情况









中国联通黄村数据中心 设计4A级绿色数据中心



DCD中型数据中心创新奖



ISO/IEC 27001

北京联通已签约客户



创新·改变世界

互联网客户

















政府客户













大型央企客户













Haier





金融客户

















数据中心建设模式转型



创新·改变世界

■ IT应用建设的不断深化,客户需主要特征

业务上线时间周期短 可供后期及时扩容 可根据需求进行改造、或提供定制 化方案。

■ 传统数据中心建设模式面临的问题 建设时间长。 新建数据中心位置不佳 一次性规划建设资产闲置 基础设施扩容、改造难 节能减排措施实施难。



房空闲,为IDC建设创造条件,完全复合数据中心对承重,消防,保温的要求。

提高现有资源利用率:空闲机房地理位置优越,便于投产,销售,提高现有资源利用率。

提前交付:免去土地获取,土建可研的时间,缩短了交付时间,可提前9到18个月投产。



北京联通新落成数据中心



创新·改变世界



黄村仓储式微模块数据中心



·创新·改变世界

数据中心位于大兴区林校南路,西侧紧邻京开路,南侧紧邻南六环。土地使用证齐全。

理念:

利用现有空闲仓库,回收资金,改造为数据中心。

原则:

不改变仓库原有建筑及消防结构,减少投资。

规划方案:

现有的3#、4#仓库改造成IDC机房,建筑面积共5600平 米,布署IDC机架1000架以上。










黄村仓储式微模块数据中心



创新·改变世界

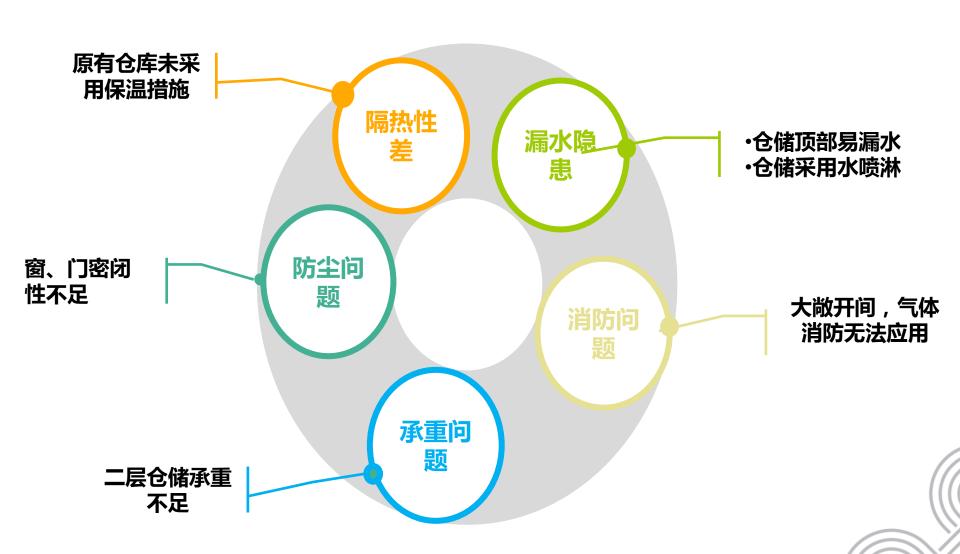

微模块机房架构














楼宇模块化数据中心

集装箱模块化数据中心 防护外壳

仓储式微模块机房

- 将IT机柜、空调系统、散热系统、配电系统、监控系统、消防系统、安防系统、照明等封闭在一个模块 化箱体内;
- 通过冷、热通道隔离,满足IT设备运行要求。满足数据中心机房环境相关技术规范。

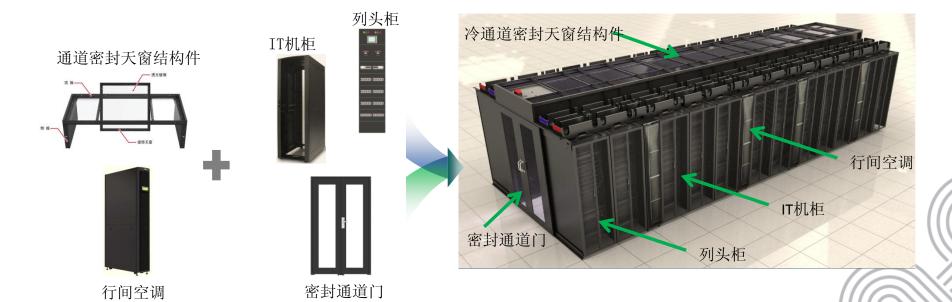


黄村数据中心规划方案




Ups噪音,铅酸蓄 电释放气体等因素 影响机房内环境;


微模块内只集成末 端水冷空调,气灭 消防,列头柜及机 架。

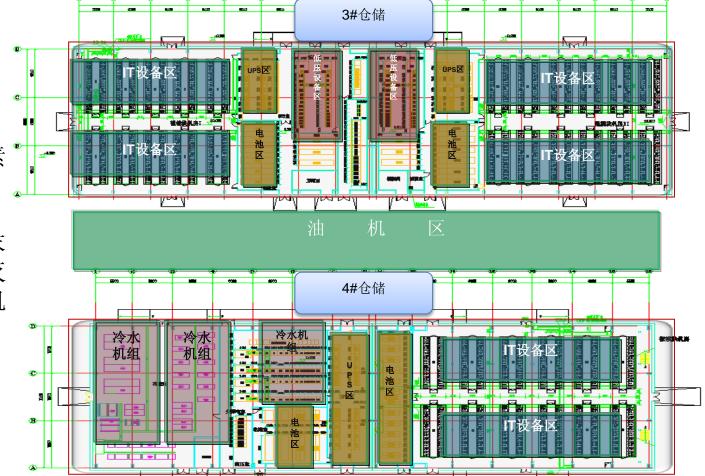

仓库内部微模块部署方案



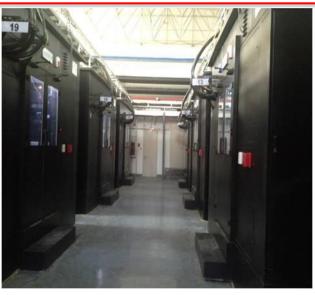

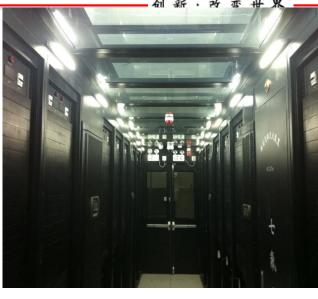

China unicom中国联通

3#库微模块数量:

模块类型	机架功耗	单位	数量	备注
微模块A(5kw长列)	5kW	组	16	28架/组,机架共448架
微模块C(10kw)	10kW	组	6	24架/组,机架共144架

4#库微模块数量:

模块类型	机架功耗	单位	数量	备注
微模块A(5kw长列)	5kW	组	7	28架/组,机架共196架
微模块B(5kw短列)	5kW	组	14	13架/组,机架共182架

共计 1102个 机柜 /

黄村数据中心微模块机房内部规划




参照国际tier III+ 的标准

机架:2200mm高机柜提供46U可用空间,单机架电量为5KW,共28个机柜.

空调:8台水冷空调末端,其中1台为带加湿功能,6+2冗余配置。


消防:采用七氟丙烷气体气灭装置。

集成温湿度探测器,声光报警器,灭火控制盘等,便于远端监控,集中化运维管理。

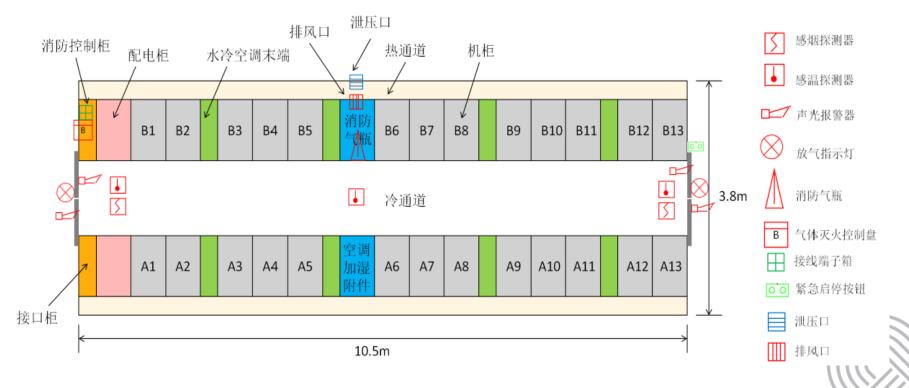

微模块内整体监控



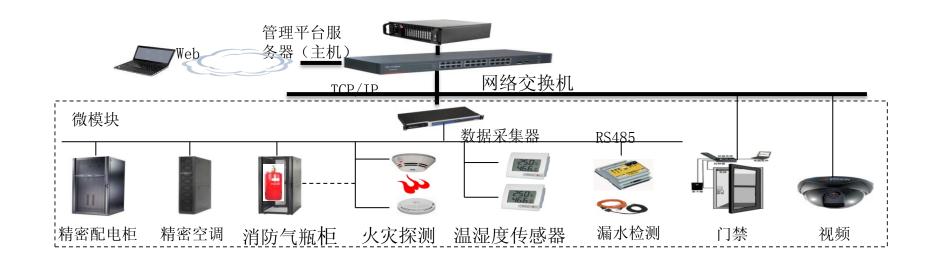

动力与环境监控系统、视频监控系统,密封通道门禁系统,模块内部设备及环境的精细管理。

充分利用闲 置资源



绿色节能

支持充分利用现有闲置资产,降低建造投资成本。

解决仓库环境带来的隔热 性差、存在漏水隐患、防 尘和消防等难题。 节省土建设计,施工时间, 微模块工厂预制,现场快速组装,短短三个月之内 过部署数十个微模块机房, 共计千余机柜,大幅度缩 短建设周期。

微模块封闭式制冷,冷热通道分离,优化气流组织,降低了空调功耗。 多种节能措施的使用,使 PUE < 1.5,实现了节能减排。

China



- 1 北京联通仓储式模块化数据中心
- 2 北京联通绿色节能措施
- 3 北京联通未来数据中心发展方向

黄村数据中心绿色节能措施




黄村数据中心年均PUE = 1.465。

电源节能措施:

- 通过平面的合理布局,缩短供电路径,减少有色金属的消耗和线路损耗。
- 供配电系统采用低压就近无功补偿的方式,减少无功电流在供电路径及变压器中的损耗。
- 选用更低功率损耗的新型、节能型干式变压器,优化变压器运行方式。
- 选用转换效率更高的IGBT整流型UPS主机,有效减小线路和变压器的损耗。

制冷节能措施:

- 采用大制冷量、高能效比的离心式冷水机组,其COP高达6.1,
- 冷却塔、空调水泵均采用变频技术,可以将设计安装的 富裕量进行有效调节,改善运行工况,提高空调工作效率,达到节能目的。
- 板式换热,自然冷源制冷技术,降低空调系统运行能耗。IDC机房在一年四季需要不间断供冷,利用北方地区冬季和过渡季室外温度低的特点,冬季可不开启冷水机组,而利用冷却塔和节能换热器的间接方式实现自由冷却免费供冷。




黄村数据中心绿色节能措施



为报期 一 行间空调,封闭冷热通道

- 空调靠近热源、近距离平 行送风,有效消除局部热 点。提高空调出风温度有 效降低空调能耗。
- 密闭冷热通道,冷热气流 隔离,有效优化气流组



微模块 内部



- 密封冷通道顶部为钢 化玻璃天窗结构,有 效利用自然光,
- 设置有LED照明,高效 节能。



智能化,集中化环境监控

- 微模块内部环境集中化 监控,无人值守
- 统一告警,精细化管 理。







广泛应用绿色节能技术



对已建机房,不断优化改造,以达到节能减排的目的。


上送风空调系统, 空调的能量有相当大一部分消耗在了降 低环境 温度上,而不是直接去降低设备的温度

精准送风系统

将机房内所有的专用空调进行并联,空调冷风采用全 封闭冷风管道送风方式,将空调冷风直接输送到每个机柜的内 部,对机柜内设备进行冷却散热。

具体效果:

机房空调开启减少2台 平均每月节省用电24068度 机房PUE值:从1.83降至1.71

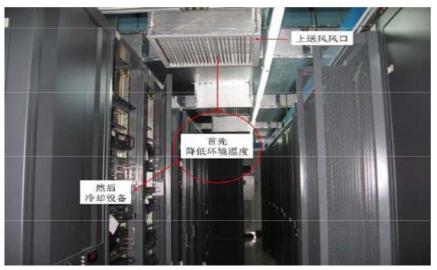










- 1 北京联通仓储式模块化数据中心
- 2 北京联通绿色节能措施
- 3 北京联通未来数据中心发展方向

建设轻资产,定制化数据中心



创新·改变世界

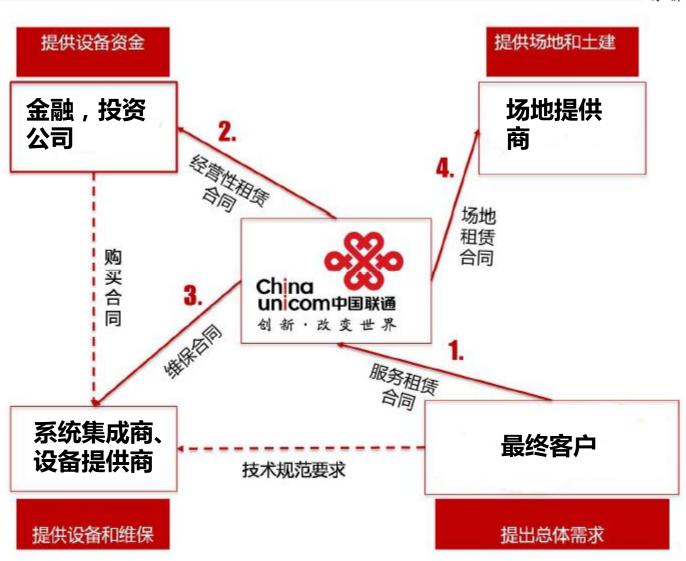


发展云计算业务



创新·改变世界

大力发展云计算业务,进一步实现绿色节能

云服务通过结合虚拟化技术,租用服务的模式等,整合一般常用的IT设备,如服务器,存储硬件,电源管理,提高设备的使用效率和频率,减少设备的使用量,从而节省硬件设备和电力的消耗。

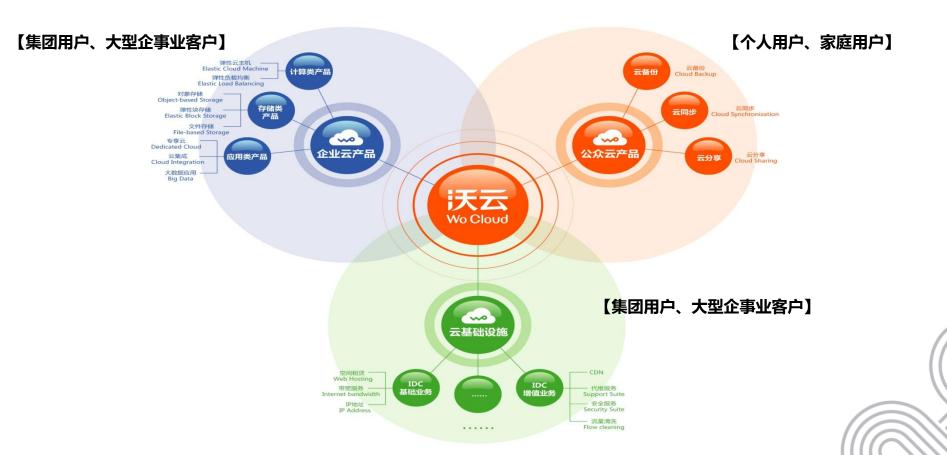

SDN技术整合数据中心资源



创新·改变世界

■ 碎片机架整合


利用SDN整合各机房内零散资源(以U为单位,单机架资源),实现流量调度,充分利用现有资源,提供虚拟化机架服务。

■解决机房内东西向流量问题


云计算的引入,带宽流量不在是垂直化的,服务器之间的流量增加,利用SDN提高东西流量效率,减轻出口路由器的负荷。


■数据中心之间流量调度,提供类局间光纤的服务。

■ 未来向云计算业务平滑过渡。









绿色、高效数据中心

减少土建+ 低功耗绿色机房+双冗余短距离供电=绿色节能

